


第1系統排気の自主測定及びクロスチェックの結果について

採取日	PCB mg/m ³ N		ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³ N		備考
	SN 活性炭前	SN 活性炭後	SN 活性炭前	SN 活性炭後	
平成 22 年					SN : セーフティネット
1月22日	0.00080	0.0000063	0.0080	0.00047	
2月17日	0.00071	0.0000056	0.00034	0.0000018	
3月16日	0.00034	0.0000040	0.00038	0.000026	
4月28日	0.00059	0.0000073	0.000019	0.000011	
5月19日	0.0011	0.0000070	0.0000068	0.00000047	
6月8日	0.0012	0.0000084	0.0000095	0.0000014	
7月14日	0.0021	【0.000015】 (0.00000053)	0.000018	【0.0000032】 (0.000000093)	【 】内 : 道分析結果 ()内 : 出口ポート
8月18日	0.0011	0.000015	0.000077	0.00000062	
9月17日	0.0021	0.000016	0.000040	0.0000088	
10月26日	0.00071	0.0000068 (0.0000029)	0.000091	0.000040 (0.0000058)	()内 : 出口ポート
11月17日	分析中	分析中	分析中	分析中	
12月10日	分析中	分析中	分析中	分析中	
排出管理 目標値	—	0.01	—	0.1	

備考特記無い場合、排出源モニタリングポイントで採取

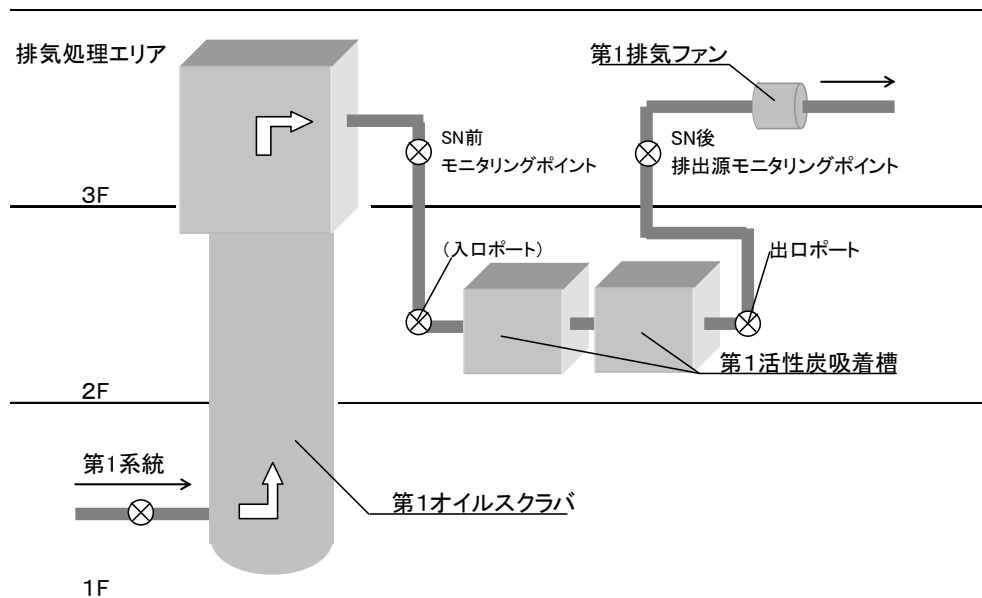

参考 : 第1系統排気系統図
