資料4－3

：建設JV　：建設JV以外　：空調及びOLM停止　：検査　：受入、その他　太枠線：予定、着色線：実績

日本環境安全事業株式会社
北海道事業所　運転管理課

(H21) 10 月度　定期点検業務・実績工程

来歴						
作成	平成	21	年	11	月	27	日
改訂1	平成		年		月		日
改訂2	平成		年		月		日
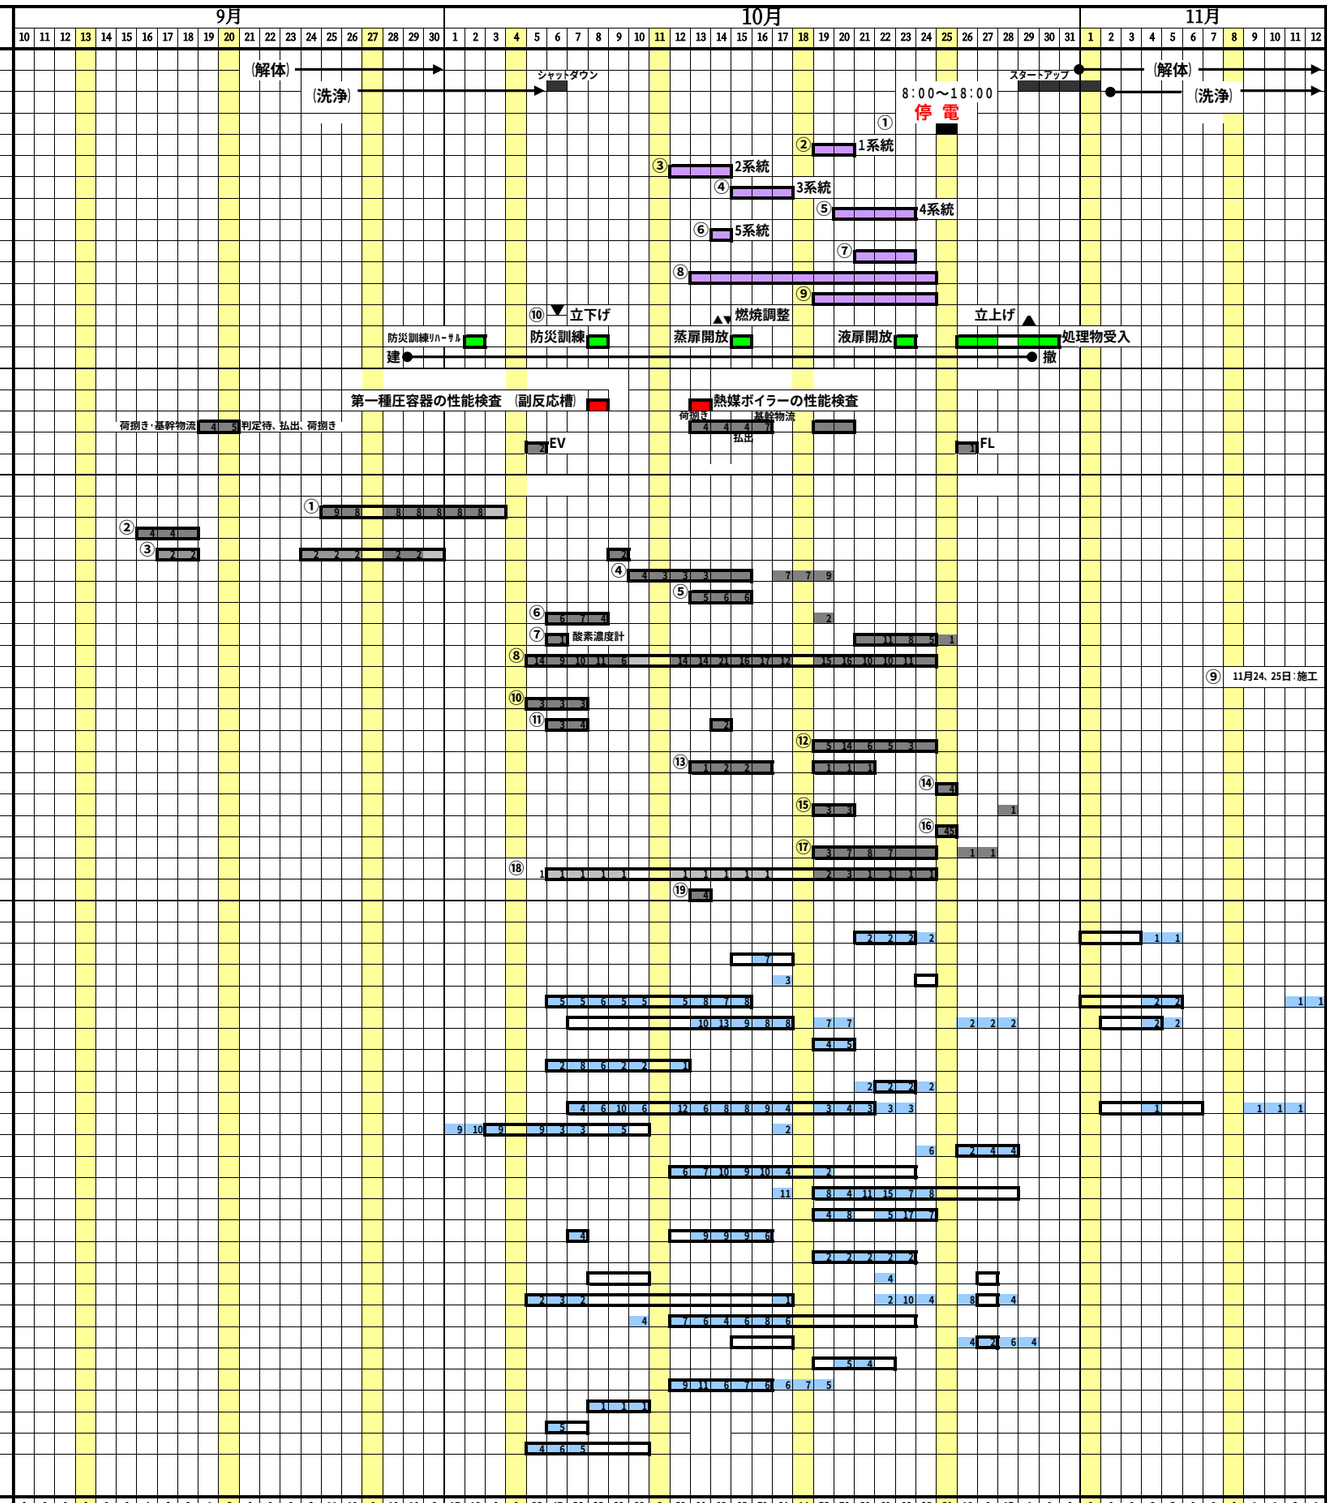
詳細工程No	項目			担当 JESCO	MEPS	施工者
1．運転状態						
	シャットダウン･スタートアップ					
①	運転停止（機能停止）	電気設備				
②		換気空調	第1系統	作業ｽﾍﾟｰｽ、RD抜油室(-40)：天井裏、前室の一部（±0）			
③		〃	第2系統	排気処理ｴﾘｱ、判定待室、検査室、抜油装置室（-20）			
④		〃	第3系統	液処理ｴﾘｱ（-20）			
⑤		〃	第4系統	蒸留ｴﾘｱ（-20）			
⑥		〃	第5系統	2次廃棄物保管倉庫、荷捌室、前室A、受入室（±0）			
⑦		排気空調	第1･2系統	17時～翌日8時まで停止　（換気空調も連動停止）			
⑧		分析空調					
⑨		オンラインモニタリング					
⑩		熱媒ボイラー					
	処理物受入、その他						
	作業員･休憩所						
2．法定点検業務						
①	第1種圧力容器、熱媒ボイラー		年次			
②	自動物流倉庫性能検査		年次	H	K	Y
③	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ定期点検		月次	Y	S	N
3．定期点検業務						
①	冷却水設備			N	N	S
②	冷却水ポンプ			N	N	K
③	冷水設備			N	N	K
④	熱媒設備			N	K	H
⑤	窒素製造設備			N	K	M
⑥	圧縮空気製造設備			N	K	M
⑦	粉末消火設備			M	U	N
⑧	換気空調設備（機械設備）			N	N	O
⑨	換気空調設備（中央監視システム）			N	N	Y
⑩	換気空調設備（活性炭装着集塵機）			M	O	F
⑪	分析室（装置定期点検）			T	K	Y
⑫	分析室･空調設備（給気）			T	K	Y
⑬	分析室（ガスクロマトグラフ定期点検）			T	K	K
⑭	無停電電源工事			N	S	
⑮	分散型デジタル制御システム			I	U	T
⑯	電気設備定期点検			N	S	Y
⑰	ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置、PCB濃度計			I	S	I
⑱	操業管理システム			N	S	K
⑲	ｺﾝﾃﾅ払出ｺﾝﾍﾞｱ秤量器			I	S	M
⑳	前処理、液処理･蒸留設備					
1	小型ﾄﾗﾝｽ解体機器			M	O、K	N
2	大型ﾄﾗﾝｽ解体機器			M	O、K	N
3	解体前洗浄移載機			M	O、K	N
4	ｺﾝﾃﾞﾝｻ解体機器			M	O、K	M
5	真空超音波洗浄装置			O	O、K	K
6	搬送設備			H	O、K	K
7	撹拌洗浄設備			O	O、K	M
8	減容圧縮機			O	O、K	K
9	真空加熱装置			O	O、K	K
10	副反応槽法定点検前整備			S	O、K	Y
11	ｵｰﾄｽﾄﾚｰﾅｰ			S	O、K	S
12	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			S	O、K	Y、O
13	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ回収ﾎﾟﾝﾌﾟ			S	O、K	K
14	排気空調設備			N	O、K	U
15	ｷｬﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ			M	O、K	K
16	潤滑油交換（撹拌機、ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ）			M	O、K	O
17	配管清掃			S	O、K	K
18	金属管式ﾚﾍﾞﾙ計清掃			I	O、K	S
19	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ			I	O、K	K
20	圧力伝送器（蒸留塔頂）			I	O、K	S
21	界面計			I	O、K	S
22	ﾛｰﾄﾞｾﾙ			I	O、K	S
23	酸素濃度計			I	O、K	S
24	ｶﾞｽ検知器			I	O、K	S
25	漏洩検知装置			I	O、K	K
		入構者数	総合計	1316
